METHODS DEPARTMENT
LKU - TD

MĚSTYS DOUDLEBY - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
HARMONOGRAM

VCES
A BOUYGUES CONSTRUCTION COMPANY

ID	Task Name	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	**MILNÍKY**	**511 dny**	**24.10. 19**	**08.11. 21**
2	Předání a převzetí staveniště	0 dny	24.10. 19	24.10. 19
3	Zahájení přípravných prací	0 dny	24.10. 19	24.10. 19
4	Dokončení stavebních prací	0 dny	18.10. 21	18.10. 21
5	Předání a převzetí díla	0 dny	22.10. 21	22.10. 21
6	Vyklizení staveniště	0 dny	08.11. 21	08.11. 21
7	**PŘÍPRAVNÉ PRÁCE**	**99 dny**	**24.10. 19**	**10.03. 20**
8	Mobilizace	6 dny	24.10. 19	31.10. 19
9	Zařízení staveniště	25 dny	05.02. 20	10.03. 20
10	**VÝSTAVBA**	**424 dny**	**03.02. 20**	**18.10. 21**
11	**IO-01 Tlaková kanalizace**	**351 dny**	**16.03. 20**	**18.08. 21**
12	Stoka ST souběh s SGK - bez podchodu Orlice- od ČS 1 celá Fugnerova a Švermova až po Dukelskou	124 dny	16.03. 20	03.09. 20
13	Stoka ST souběh s SGA - U Parkoviště	45 dny	11.09. 20	12.11. 20
14	Stoka ST souběh s SGA2 - U Parkoviště - konec směrem k náhonu	11 dny	13.11. 20	27.11. 20
15	Stoka ST - mimo souběh od STG 2 na ČOV	56 dny	30.09. 20	16.12. 20
16	Stoka ST1 souběh s SGC - Dukelská	16 dny	03.02. 21	24.02. 21
17	Stoka ST1 souběh s SGC1 - z Dukelské za mostem směrem k nádraží	12 dny	31.03. 21	15.04. 21
18	Stoka ST1 - přes Orlici	15 dny	16.07. 21	05.08. 21
19	Stoka ST1 souběh s SGK1 Na Benátkách	19 dny	07.06. 21	01.07. 21
20	Stoka ST2 - Kolem Orlice Od parku ke hřišti na ČS 3	8 dny	03.06. 21	14.06. 21
21	Stoka ST2 souběh s SGH1 - U Parku	13 dny	05.04. 21	21.04. 21
22	Stoka ST2 souběh s SGH1-4 - Kolem Orlice od parku směrem ke hřišti na ČS 3	14 dny	22.04. 21	11.05. 21
23	Stoka ST2 napojení na ST - Dukelská	15 dny	13.05. 21	02.06. 21
24	Stoka ST3 - u lávky přes Orlici na ČS 5	24 dny	05.07. 21	05.08. 21
25	Stoka ST4 - kousek k ST - ulice Švermova	11 dny	28.05. 21	11.06. 21
26	Stoka ST4 souběh s SGH5 - Švermova	27 dny	07.04. 21	13.05. 21
27	Stoka ST5 - Švermova (Příkazy)	7 dny	10.08. 21	18.08. 21
28	Stoka ST6 - napojení ČS 8 - U Parkoviště	4 dny	13.11. 20	18.11. 20
29	**IO-02 Gravitační kanalizace**	**383 dny**	**18.03. 20**	**05.10. 21**
30	Stoka SGA1 - Na Nábřeží	42 dny	15.10. 20	11.12. 20
31	Stoka SGB I etapa - U Bažantnice - ulice dále od D11 a dolů smerem k D11	84 dny	18.03. 20	13.07. 20
32	Stoka SGB II Etapa - kolem zámku	44 dny	13.07. 20	10.09. 20
33	Stoka SGB1 - U Bažantnice - blíže k D11	19 dny	20.04. 20	14.05. 20
34	Stoka SGC - Dukelská za přejezdem tratě (od zámku k nádraží)	25 dny	21.01. 21	24.02. 21
35	Stoka SGC1 - kolem nádraží	36 dny	25.02. 21	15.04. 21
36	Stoka SGC1-1 - přes D11 u odbočky k nádraží	14 dny	16.04. 21	05.05. 21
37	Stoka SGD - Na Bělisku od ČS 5 ke kolejím	25 dny	10.09. 20	14.10. 20
38	od kolejí a dál k D11 až po ulici k objeku k č.p. 242	39 dny	21.01. 21	16.03. 21
39	Stoka SGD1 - z ulice NA Bělisku na D11 cesta vparvo při pohledu od tratě	25 dny	03.03. 21	06.04. 21
40	Stoka SGD2 z D11 na č.p 520	18 dny	07.04. 21	30.04. 21
41	Stoka SGD3 z D11 na č.p 104	17 dny	03.05. 21	25.05. 21
42	Stoka SGD4 Na Slovensku - z D11 na č.p 545	10 dny	26.05. 21	08.06. 21
43	Stoka SGD5 - z D11 na č.p 301	28 dny	09.06. 21	16.07. 21
44	Stoka A0 - srážková kanalizace	0 dny	16.07. 21	16.07. 21

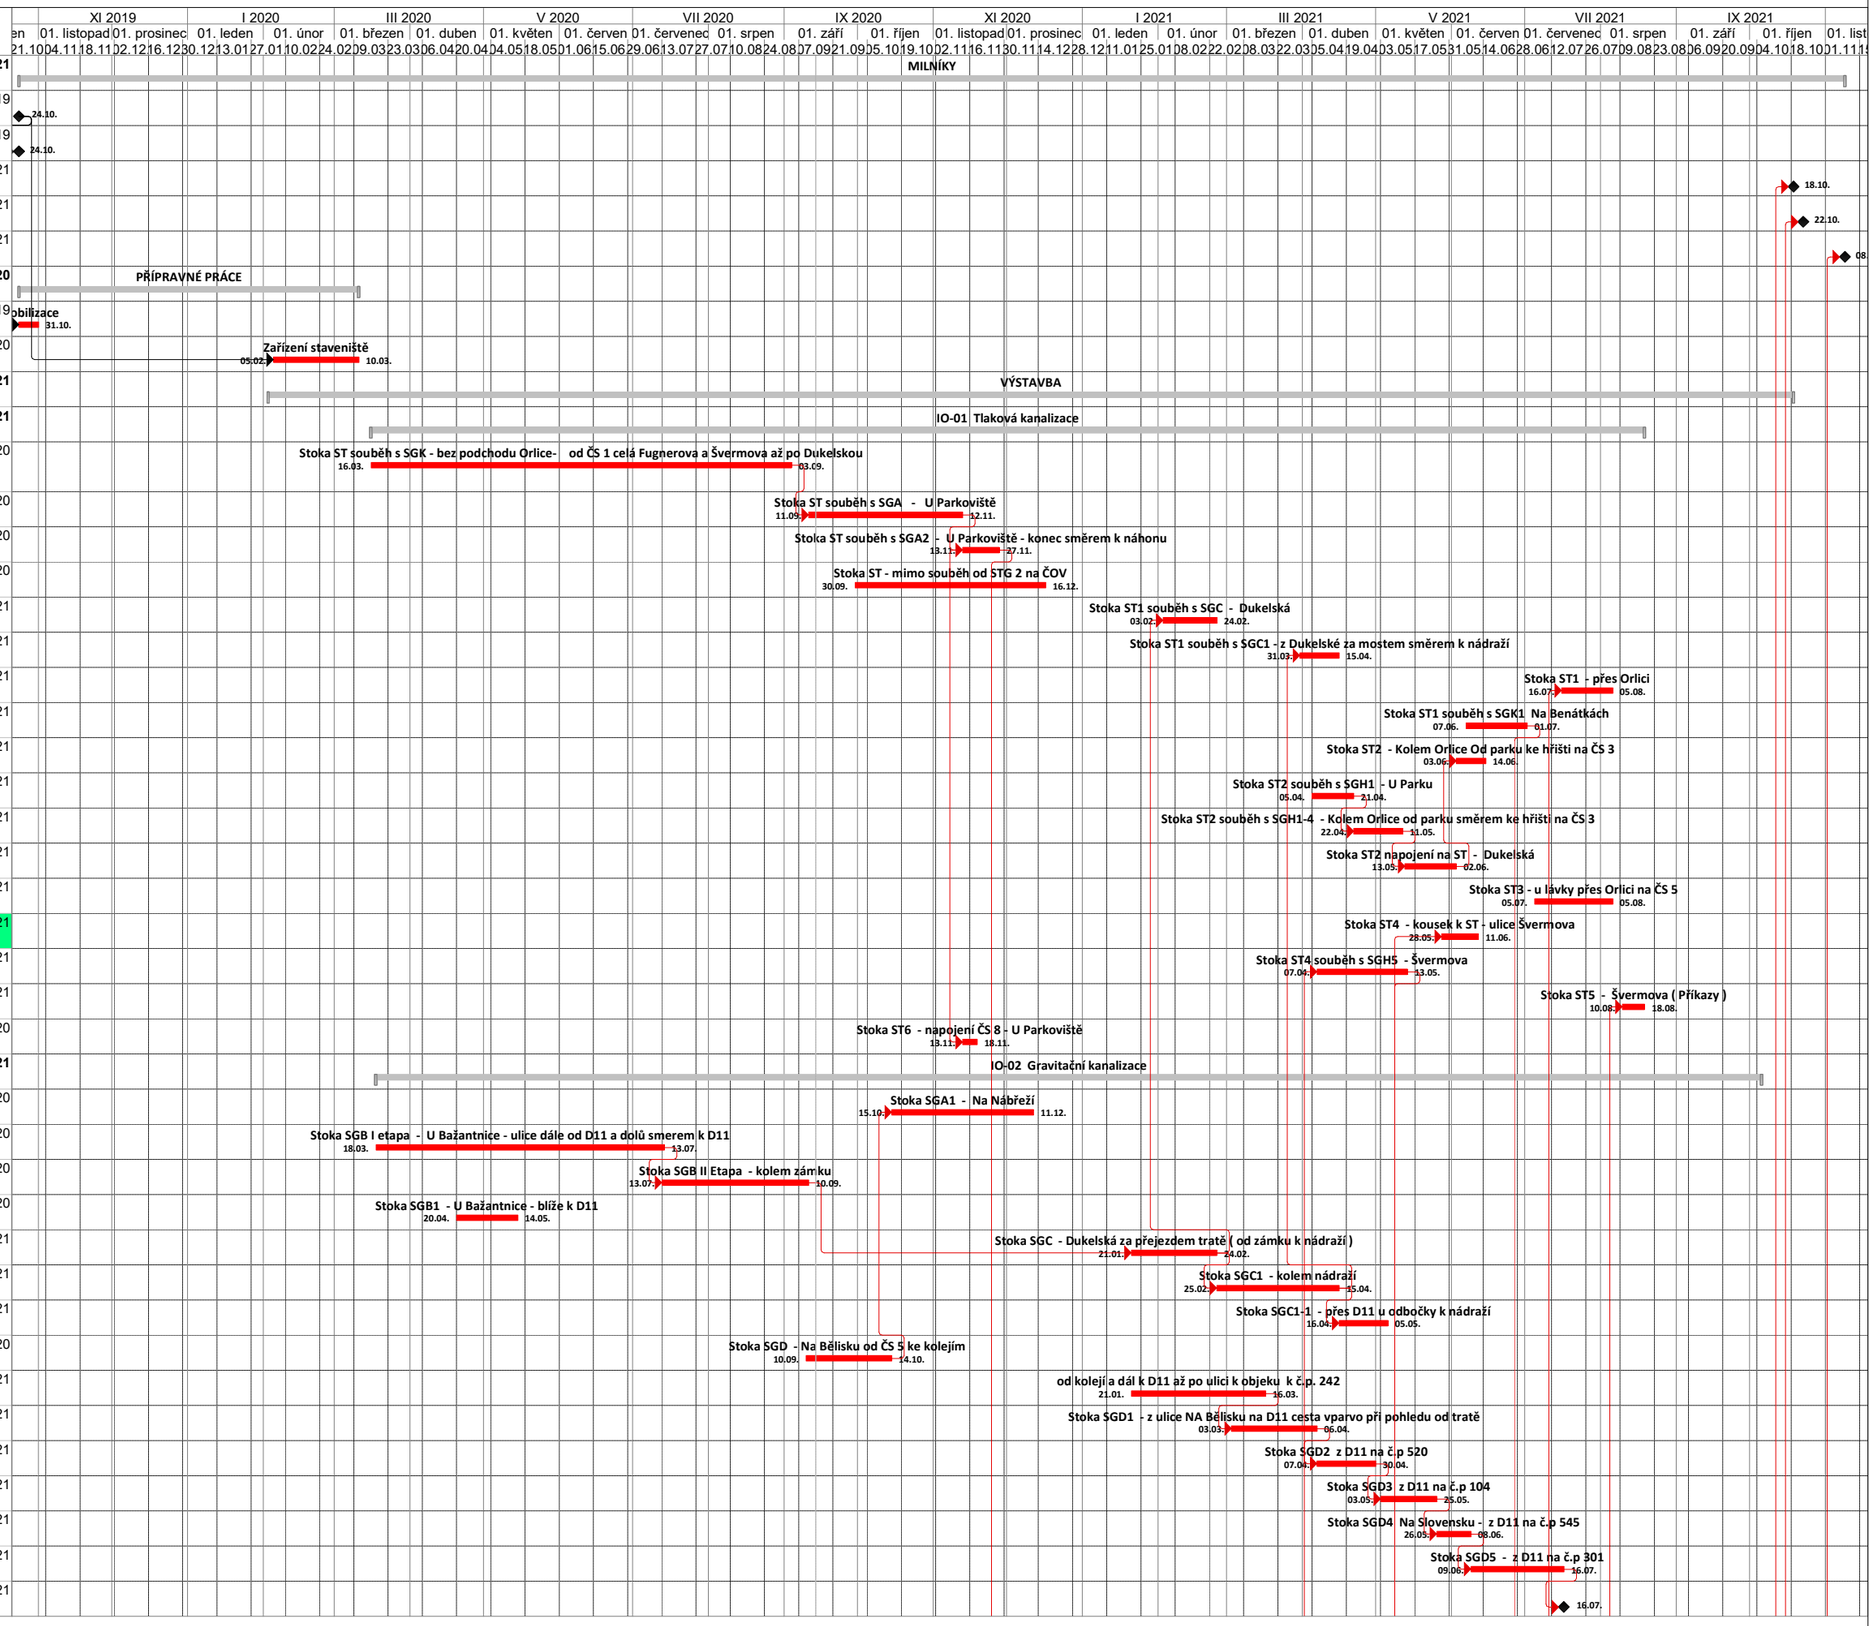

MĚSTYS DOUDLEBY - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
HARMONOGRAM

VCES
A BOUYGUES CONSTRUCTION COMPANY
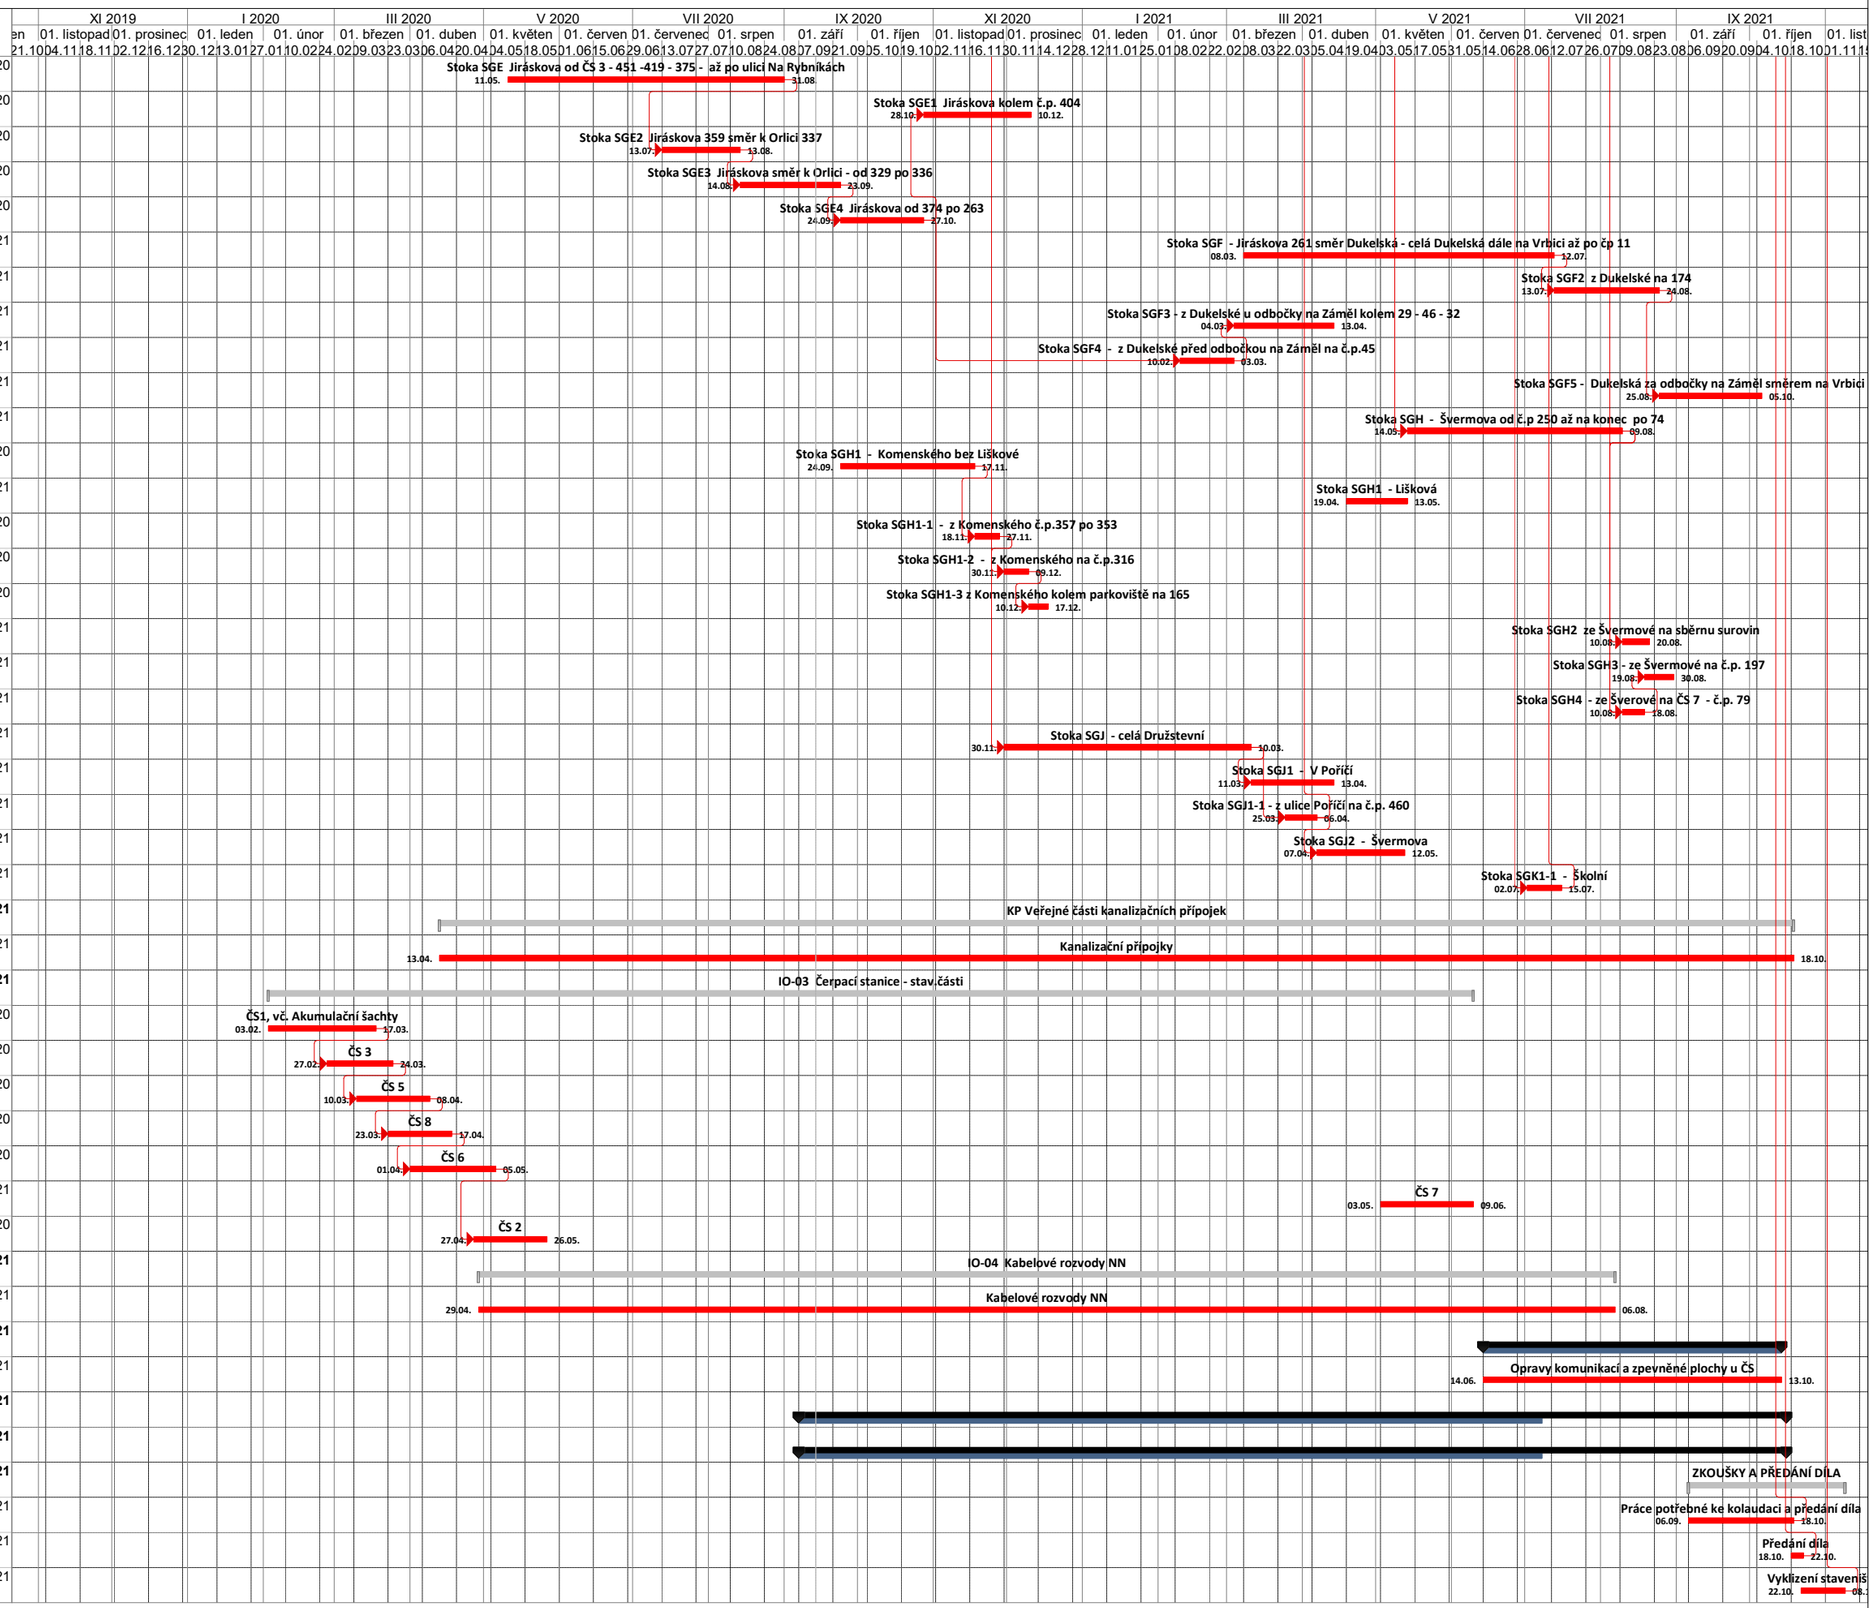
ID	Task Name	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
45	Stoka SGE Jiráskova od ČS 3 - 451 -419 - 375 - až po ulici Na Rybníkách	81 dny	11.05. 20	31.08. 20
46	Stoka SGE1 Jiráskova kolem č.p. 404	32 dny	28.10. 20	10.12. 20
47	Stoka SGE2 Jiráskova 359 směr k Orlici 337	24 dny	13.07. 20	13.08. 20
48	Stoka SGE3 Jiráskova směr k Orlici - od 329 po 336	29 dny	14.08. 20	23.09. 20
49	Stoka SGE4 Jiráskova od 374 po 263	24 dny	24.09. 20	27.10. 20
50	Stoka SGF - Jiráskova 261 směr Dukelská - celá Dukelská dále na Vrbici až po čp 11	91 dny	08.03. 21	12.07. 21
51	Stoka SGF2 z Dukelské na 174	31 dny	13.07. 21	24.08. 21
52	Stoka SGF3 - z Dukelské u odbočky na Záměl kolem 29 - 46 - 32	29 dny	04.03. 21	13.04. 21
53	Stoka SGF4 - z Dukelské před odbočkou na Záměl na č.p.45	16 dny	10.02. 21	03.03. 21
54	Stoka SGF5 - Dukelská za odbočky na Záměl směrem na Vrbici k čp 15	30 dny	25.08. 21	05.10. 21
55	Stoka SGH - Švermova od č.p 250 až na konec po 74	62 dny	14.05. 21	09.08. 21
56	Stoka SGH1 - Komenského bez Liškové	39 dny	24.09. 20	17.11. 20
57	Stoka SGH1 - Lišková	19 dny	19.04. 21	13.05. 21
58	Stoka SGH1-1 - z Komenského č.p.357 po 353	8 dny	18.11. 20	27.11. 20
59	Stoka SGH1-2 - z Komenského na č.p.316	8 dny	30.11. 20	09.12. 20
60	Stoka SGH1-3 z Komenského kolem parkoviště na 165	6 dny	10.12. 20	17.12. 20
61	Stoka SGH2 ze Švermové na sběrnu surovin	9 dny	10.08. 21	20.08. 21
62	Stoka SGH3 - ze Švermové na č.p. 197	8 dny	19.08. 21	30.08. 21
63	Stoka SGH4 - ze Šverové na ČS 7 - č.p. 79	7 dny	10.08. 21	18.08. 21
64	Stoka SGJ - celá Družstevní	51 dny	30.11. 20	10.03. 21
65	Stoka SGJ1 - V Poříčí	24 dny	11.03. 21	13.04. 21
66	Stoka SGJ1-1 - z ulice Poříčí na č.p. 460	9 dny	25.03. 21	06.04. 21
67	Stoka SGJ2 - Švermova	26 dny	07.04. 21	12.05. 21
68	Stoka SGK1-1 - Školní	10 dny	02.07. 21	15.07. 21
69	**KP Veřejné části kanalizačních přípojek**	**374 dny**	**13.04. 20**	**18.10. 21**
70	Kanalizační přípojky	374 dny	13.04. 20	18.10. 21
71	**IO-03 Čerpací stanice - stav.části**	**331 dny**	**03.02. 20**	**09.06. 21**
72	ČS1, vč. Akumulační šachty	32 dny	03.02. 20	17.03. 20
73	ČS 3	19 dny	27.02. 20	24.03. 20
74	ČS 5	22 dny	10.03. 20	08.04. 20
75	ČS 8	20 dny	23.03. 20	17.04. 20
76	ČS 6	25 dny	01.04. 20	05.05. 20
77	ČS 7	28 dny	03.05. 21	09.06. 21
78	ČS 2	22 dny	27.04. 20	26.05. 20
79	**IO-04 Kabelové rozvody NN**	**311 dny**	**29.04. 20**	**06.08. 21**
80	Kabelové rozvody NN	311 dny	29.04. 20	06.08. 21
81	**IO-05 Opravy komunikací a zpevněné plochy u ČS**	**88 dny**	**14.06. 21**	**13.10. 21**
82	Opravy komunikací a zpevněné plochy u ČS	88 dny	14.06. 21	13.10. 21
83	**PS-01 Čerpací stanice - strojní technologie**	**268 dny**	**07.09. 20**	**15.10. 21**
91	**PS-02 Čerpací stanice - silnoproudé rozvody a přenos dat**	**268 dny**	**07.09. 20**	**15.10. 21**
99	**ZKOUŠKY A PŘEDÁNÍ DÍLA**	**46 dny**	**06.09. 21**	**08.11. 21**
100	Práce potřebné ke kolaudaci a předání díla	31 dny	06.09. 21	18.10. 21
101	Předání díla	5 dny	18.10. 21	22.10. 21
102	Vyklizení staveniště	12 dny	22.10. 21	08.11. 21
